



# COMUNE DI ASCOLI PICENO

P.zza Arringo, 7  
63100 (AP)  
P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442

## LAVORI CIRCOLO TENNIS MORELLI

### PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA

numero elaborato:

Rel.Arch **8**


Responsabile del Procedimento:

Arch. Ugo Galanti  
Il Dirigente Settore Edilizia - Attività Produttive - Ambiente  
Servizi Manutentivi, Impiantistica Sportiva e Servizi Tecnico  
Patrimoniali del Comune di Ascoli Piceno

Progettista:

Arch. Roberto Ripani  
Ordine degli Architetti della Prov. di Ascoli Piceno n. 655

Via del Commercio nr. 18  
63100 - Ascoli Piceno(AP)  
Tel.- Fax. 0736-344195  
P.IVA 01909160440  
mail: info@robertoripani.it  
PEC: roberto.ripani@archiworldpec.it

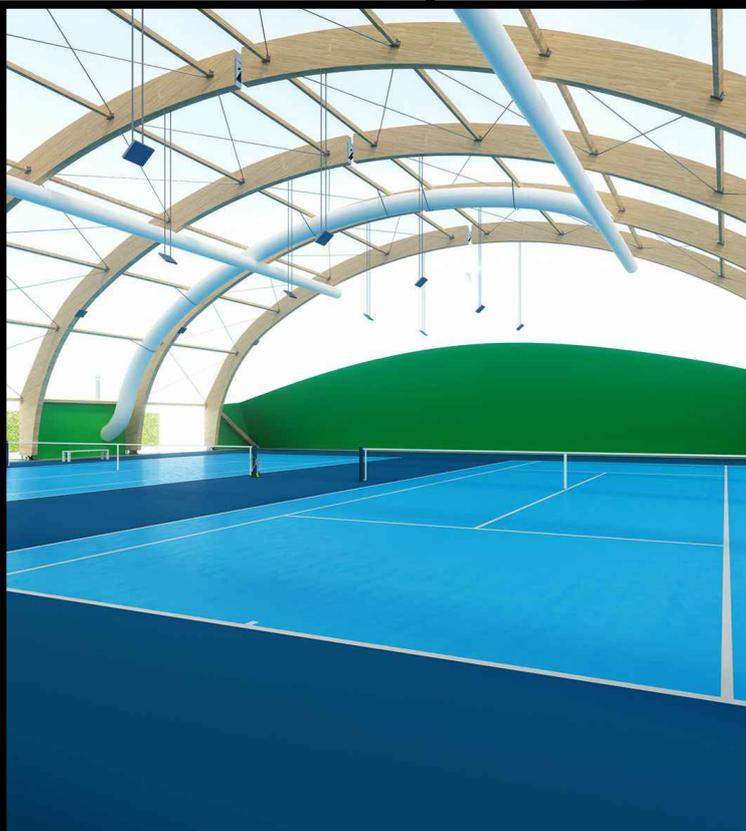

REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOME FILE
1	18 Gen 2018	Progetto esecutivo				progettoesecutivo.dwg
Codice Lavoro : <b>01/2018</b>		Data : <b>18 Gen 2018</b>		Questo disegno è proprietà riservata dell'Arch. Roberto Ripani e non può essere copiato né riprodotto o mostrato a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Arch. Roberto Ripani.		

## Lavori Circolo Tennis Morelli

---

### Comune di Ascoli Piceno

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

4-giu-2018 - 17-nov-2018

Completamento

0%

Attività

56

Risorse

0

---

Lavori di realizzazione nuova struttura di copertura in legno lamellare

---

# Lavori Circolo Tennis Morelli

## Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Allestimento Cantiere	04/06/18	06/06/18
Rimozione recinzioni esistenti ed asportazioni siepi	04/06/18	04/06/18
Realizzazione di recinzione di cantiere ed accessi	05/06/18	06/06/18
Realizzazione di impianto elettrico di cantiere e di messa a terra	07/06/18	07/06/18
Realizzazione fondazioni per sostegno travi	11/06/18	03/07/18
Demolizione pavimentazione esistente	11/06/18	11/06/18
Scavo a sezione obbligata per fondazioni	12/06/18	13/06/18
Getto calcestruzzo magro	15/06/18	15/06/18
Casseratura fondazioni	18/06/18	18/06/18
Realizzazione armatura in acciaio	19/06/18	19/06/18
Getto calcestruzzo fondazioni	25/06/18	25/06/18
Disarmo casseri	02/07/18	02/07/18
Rinterro casseri e fondazioni	02/07/18	03/07/18
Trasporto a discarica materiale di risulta	03/07/18	03/07/18
Preparazione piano di posa nuova pavimentazione dei campi	09/07/18	17/07/18
Scarificazione manto esistente	09/07/18	09/07/18
Posa rete elettrosaldata	10/07/18	10/07/18
Getto di CLS sulle giunzioni dei campi	11/07/18	11/07/18
Stesura di emulsione bituminosa	16/07/18	16/07/18
Realizzazione di tappetino bituminoso	17/07/18	17/07/18
Montaggio struttura di copertura	23/07/18	01/08/18
installazione carpenteria metallica alle fondazioni	23/07/18	25/07/18
Scarico in cantiere degli elementi lignei	26/07/18	27/07/18
Montaggio elementi lignei	30/07/18	30/07/18
Posa in opera di tiranti in acciaio	30/07/18	01/08/18
Telo di copertura	27/08/18	10/09/18
Montaggio struttura secondaria per ancoraggio telo	27/08/18	30/08/18
Scarico dall'automezzo di telo di copertura	31/08/18	31/08/18
Sollevamento in quota telo e posizionamento	03/09/18	03/09/18
Fissaggio del telo alla struttura	04/09/18	04/09/18
Messa in tensione del telo di copertura	04/09/18	04/09/18
Installazione accessori per completamento struttura	06/09/18	10/09/18
Impianto Elettrico	17/09/18	18/10/18
Realizzazione quadri di comando impianto	17/09/18	17/09/18
Installazione guaine sulla struttura in legno	19/09/18	27/09/18
Infilaggio conduttori elettrici e collegamento al quadro	26/09/18	28/09/18
Installazione accessori come da progetto	01/10/18	12/10/18
Collegamento del quadro alla linea elettrica principale	15/10/18	16/10/18
Predisposizione di collegamento nuovo generatore alla linea elettrica	17/10/18	18/10/18

# Lavori Circolo Tennis Morelli

---

## Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Impianto di Riscaldamento e ventilazione	17/09/18	24/10/18
Scavo a sezione obbligata per platea	17/09/18	17/09/18
Realizzazione di cassature per platea	18/09/18	18/09/18
Posa rete elettrosaldata	19/09/18	19/09/18
Getto in cls per completamento	20/09/18	20/09/18
Installazione tubo di ventilazione	15/10/18	15/10/18
Installazione nuova generatore	19/10/18	23/10/18
Collegamento tubazioni al generatore	22/10/18	24/10/18
Allacci alle linee di adduzione esistenti	29/10/18	30/10/18
Scavo a sezione obbligata e rinterrò	29/10/18	29/10/18
Posa in opera di corrugati	29/10/18	29/10/18
Infilaggio conduttori	30/10/18	30/10/18
Nuova pavimentazione dei campi da tennis	31/10/18	08/11/18
posa in opera pavimentazione in resina	31/10/18	31/10/18
Finiture dei campi da tennis	12/11/18	16/11/18
Tracciamento linee	12/11/18	13/11/18
Posa in opera reti e accessori necessari	14/11/18	16/11/18

