

COMUNE DI ASCOLI PICENO

(Provincia di Ascoli Piceno)

OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NELLA ZONA EST DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTA' – 2° stralcio (prima fase)

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno


Ascoli Piceno li 25/09/2017

IL PROGETTISTA
Geom. Marco Paoletti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Silvia Alessandra Giacomini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo contrattuale: giorni 210

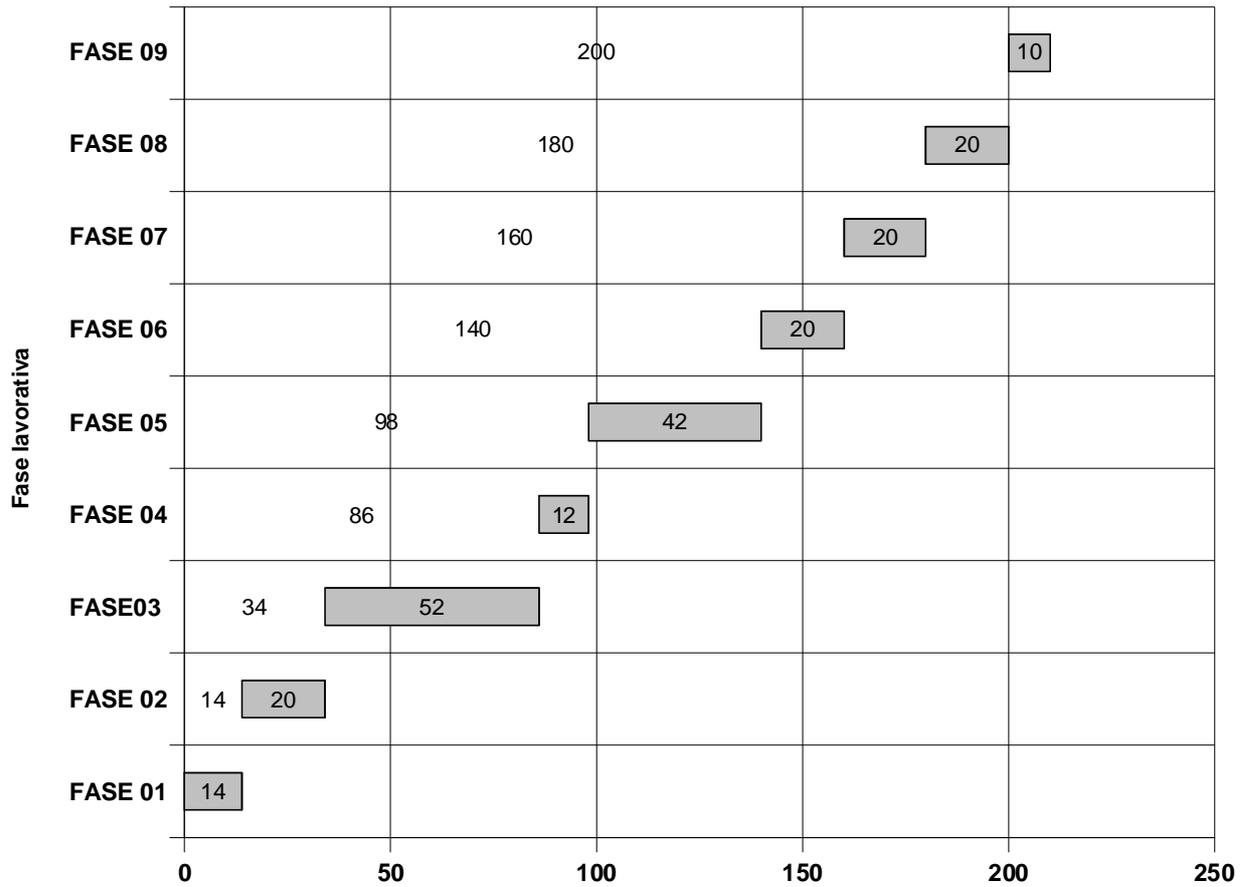

| | FASE 01 | FASE 02 | FASE03 | FASE 04 | FASE 05 | FASE 06 | FASE 07 | FASE 08 | FASE 09 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■durata | 14 | 20 | 52 | 12 | 42 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Giorno inizio | | 14 | 34 | 86 | 98 | 140 | 160 | 180 | 200 |

FASE 01 – Installazione cantiere spicco corpi A-B ,scavi, fondaz. in c.a.(corpo A parz.)

Installazione cantiere spicco corpi A-B, realizzazione di: opere di scavo e trasporto a rifiuto del materiale terroso relativo alla platea di fondazione, realizzazione platea in c.a.e riprese ferri per la futura elevazione, spostamento o deviazione sottoservizi e realizzazione del nuovo tratto di fognatura compreso gli innesti dei discendenti..

Percentuale incidenza lavori: 6,83% Durata fase lavorativa: gg. 14 Importo: € 31.524,95

FASE 02 – Scavi, demolizioni e fondazioni in c.a. (corpo B)

Realizzazione di: opere di scavo e trasporto a rifiuto del materiale terroso relativo ai plinti, alla platea di fondazione e travi di collegamento, demolizioni pavimentazioni, cordoli, e tratti di soletta in c.a. dei marciapiedi e zanelle. realizzazione platea, plinti di fondazione e travi di collegamento in c.a., realizzazione di massetto in cls con maglia elettrosaldata, spostamento o deviazione sottoservizi e realizzazione del nuovo tratto di fognatura compreso gli innesti dei discendenti.

Percentuale incidenza lavori: 9.11% Durata fase lavorativa: gg. 20 Importo: € 42.058,33

FASE 03 – Strutture in c.a. loculi e pilastri 1° livello.e vano scala (corpo B)

Realizzazione di: discendenti in p.v.c. ; impalcature fino a quota 6 mt , pilastri 1° livello, blocchi loculi costituiti da setti e solette in c.a., elevazione vano scala.

Percentuale incidenza lavori: 22,49 % Durata fase lavorativa: gg. 52 Importo: € 103.788,85

FASE 04 – Struttura in c.a. 2° livello travi e soletta - (corpo B)

Realizzazione di scarichi raccolta acque a quota della pavimentazione 2° livello; carpenteria e puntellature maggiorate, travi e soletta in c.a. 2° livello

Percentuale incidenza lavori: 5,95% Durata fase lavorativa: gg. 12 Importo: € 27.456,33

FASE 05 – Strutture in c.a. loculi e pilastri 2° livello (corpo B)

Realizzazione di: discendenti interni in PVC ; blocchi loculi costituiti da setti e solette loculi in c.a.; impalcature 2° livello ; pilastri 2° livello

Percentuale incidenza lavori: 17,31% Durata fase lavorativa: gg. 42 Importo:€ 79.889,55

FASE 06 – Soletta copertura (corpo B)

Realizzazione di: carpenteria, travi e soletta in c.a. a livello copertura compreso quella del vano scala ; massetto in cls per formazione di pendenze e impermeabilizzazione copertura e copertina in travertino a livello copertura ; raccordi discendenti interni e griglie di protezione

Percentuale incidenza lavori: 10,69% Durata fase lavorativa: gg. 20 Importo: € 49.349,57

FASE 07 – Rivestimenti, pavimentazioni e opere connesse. 2° livello (corpo B)

Realizzazione opere di finitura sull'intero intervento comprendenti : impermeabilizzazione loculi, accoltellata in mattoni, rivestimenti in travertino romano per le testate e bocciardato per le riquadrature dei loculi, massetti, pavimentazioni, scarichi pozzetti e chiusini, ringhiere in ferro, trattamento protettivo idrorepellente delle parti in calcestruzzo e mattoni esposte agli agenti atmosferici,

Percentuale incidenza lavori: 11,35% Durata fase lavorativa: gg.20 Importo: € 52.380,02

FASE 08 – Rivestimenti, pavimentazioni e opere connesse. 1° livello (corpo B)

Realizzazione opere di finitura comprendenti :impermeabilizzazione loculi, rivestimenti in travertino bianco per le testate ed oniciato per le riquadrature dei loculi,gradini in travertino vano scala, massetti, pavimentazioni, caditoie,i chiusini, cordoli e zanelle, trattamento protettivo idrorepellente delle parti in calcestruzzo esposte agli agenti atmosferici.

Percentuale incidenza lavori: 11,37% Durata fase lavorativa: gg. 20 Importo: € 52.451,19

FASE 09 –Infissi, chiusini in travertino per i loculi 1°e 2° livello corpo B, opere complementari

Realizzazione di ulteriori opere di finitura sull'intero intervento consistenti in:montaggio vetro per ringhiere, sistemazione a verde dei campi di inumazione, installazione fontana pulizia e smobilizzo cantiere

Percentuale incidenza lavori: 4,90% Durata fase lavorativa: gg. 10 Importo: € 22.601,21

IL PROGETTISTA
Geom. Marco Paoletti
